



Johnson Controls

SDAI | SCA | CFTV

Atalhos de Páginas	Início	Índice
Nossa Parceria	KPI SDAI	KPI SCA
KPI CFTV	Quantidade de horas na manutenção	SDAI - Detalhes Falhas
SDAI - Desabilitados	CFTV - Detalhes	CFTV - Lista de câmeras
Sugestões de Melhorias	SDAI - Mapeamento	SDAI - Painéis e laços
SDAI - Salas ocupadas TB	SDAI - Salas ocupadas TA	SDAI - Módulos
Próximos Desafios	Organograma da Equipe	



HOME

Relatório Gerencial Complexo - Domo Business

Março de 2026

The power behind **your mission**



Índice

Nossa Parceria / Mensagem a Administração 3

Resultados Operacionais 4-11

Sugestões de Melhorias / Próximos Desafios 12-18

Estrutura Equipe 19



The power behind your mission

Nossa Parceria

A Johnson Controls está presente em três frentes de manutenção no Domo Business.

Sistema de Controle de Acesso - SCA



Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio - SDAI



Circuito Fechado de Televisão - CFTV



Mensagem à Administração

Nesse relatório apresentamos informações sobre o sistema instalado bem como os serviços prestados para o Domo Business. Os resultados operacionais, sugestões de melhorias e próximos desafios.



SDAI - Falhas, desabilitados e disponibilidade do sistema

Falhas sem as obras

429 - 50 = 379

Total de Detectores e módulos

5533

Falhas + Desabilitados

429

Falhas

361

Desabilitados

68

% Disponível SDAI


92%



Local	Qtde	Tipo
Área comum	144	Falhas
Área Privativa	275	Falhas
Obras	3	Desabilitados
Mall	+ _ 20	Loja 10 e Loja 5
TA - 25º	+ _ 30	Andar todo


junho de 2025	julho de 2025	agosto de 2025	setembro de 2025	outubro de 2025	novembro de 2025	dezembro de 2025	janeiro de 2026	fevereiro de 2026	março de 2026	abril de 2026	maio de 2026	junho de 2026	julho de 2026	agosto de 2026	setembro de 2026	outubro de 2026
>																

Disponibilidade SDAI



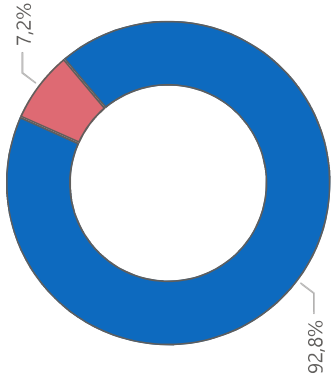


● Equipamentos OK ● Equipamentos NOK

Falhas e Desabilitados por mês

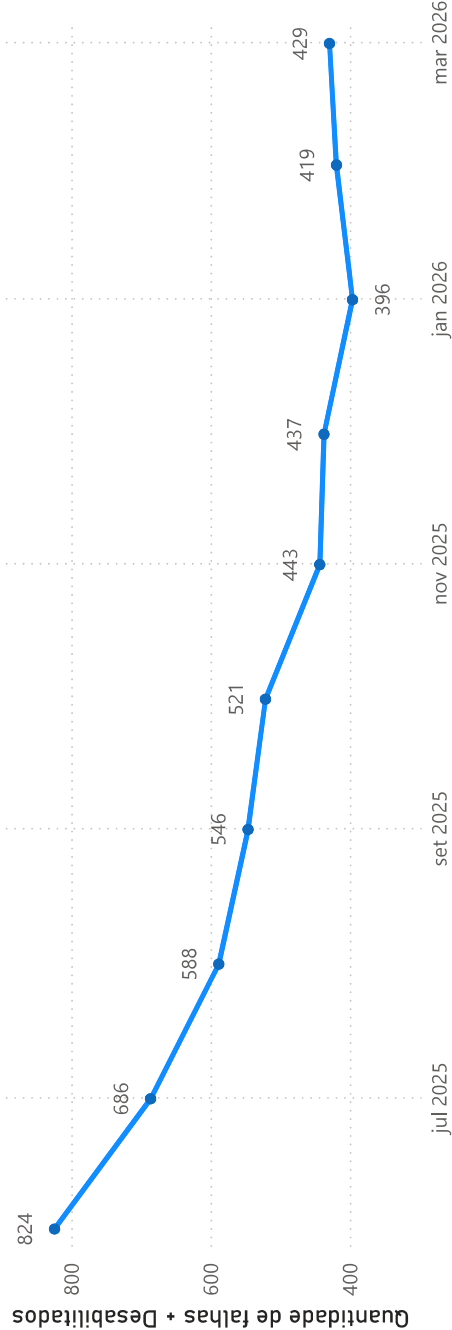

SCA - Falhas e disponibilidade do sistema

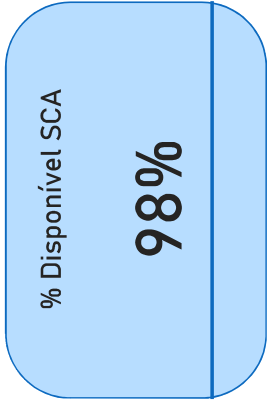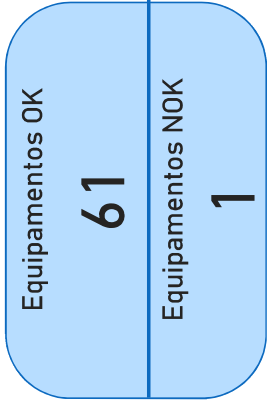

Local	Qtde	Tipo
Área comum	61	Online
Área comum	1	Offline


Equipamentos NOK

Equipamento	Acesso	Local	QtdeNOKSCA
Acesso estacionamento Hall	Entrada/Saída	Estacionamento	1
Total			1


Mês

junho de 2025	julho de 2025	agosto de 2025	setembro de 2025	outubro de 2025	novembro de 2025	dezembro de 2025	janeiro de 2026	fevereiro de 2026	março de 2026	abril de 2026	maio de 2026	junho de 2026	julho de 2026	agosto de 2026	setembro de 2026	outubro de 2026
---------------	---------------	----------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	----------------	------------------	-----------------

Disponibilidade SCA

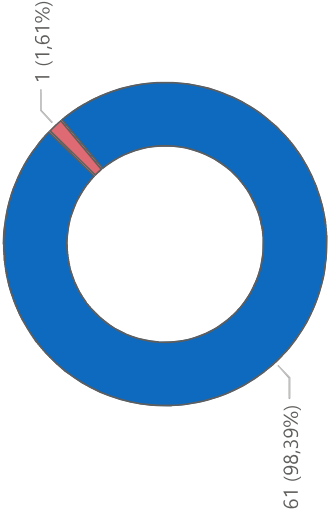

Quantidade de corretivas por mês

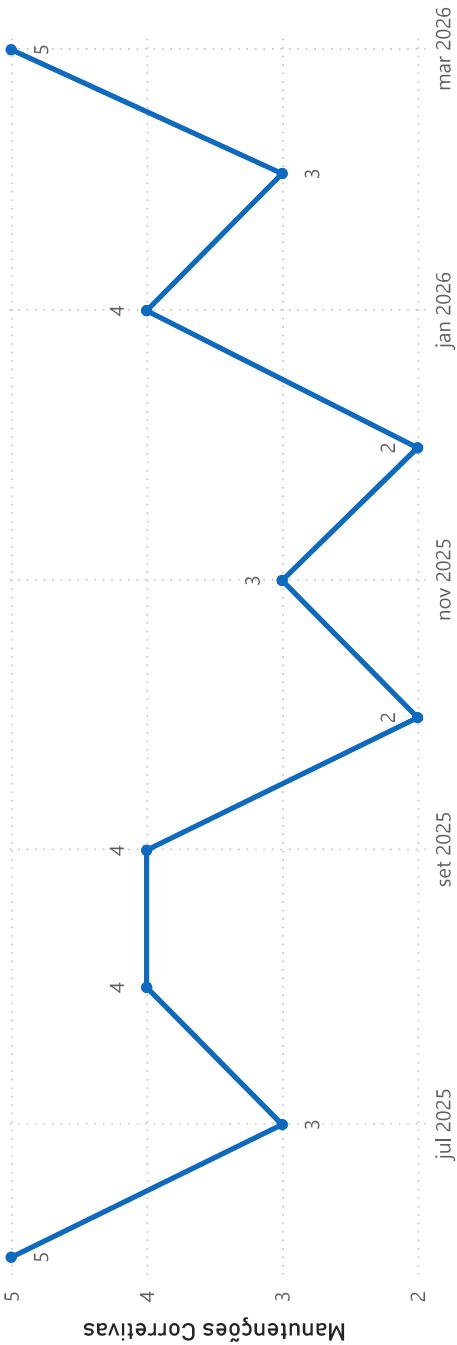

● Equipamentos OK ● Equipamentos NOK

CFTV - Falhas e disponibilidade do sistema



Local	Qtde	Tipo
Área comum	9	Offline

Total de equipamentos
419

Total de câmeras
385


Câmeras online
376

Câmeras offline
9


% Disponível do CFTV
98%

junho de 2025	julho de 2025	agosto de 2025	setembro de 2025	outubro de 2025	novembro de 2025	dezembro de 2025	janeiro de 2026	fevereiro de 2026	março de 2026	abril de 2026	maio de 2026	junho de 2026	julho de 2026	agosto de 2026	setembro de 2026	outubro de 2026
---------------	---------------	----------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	----------------	------------------	-----------------

Disponibilidade do CFTV

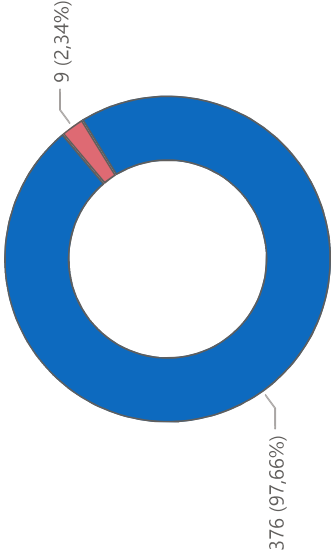

Soma de Corretivas por Mês

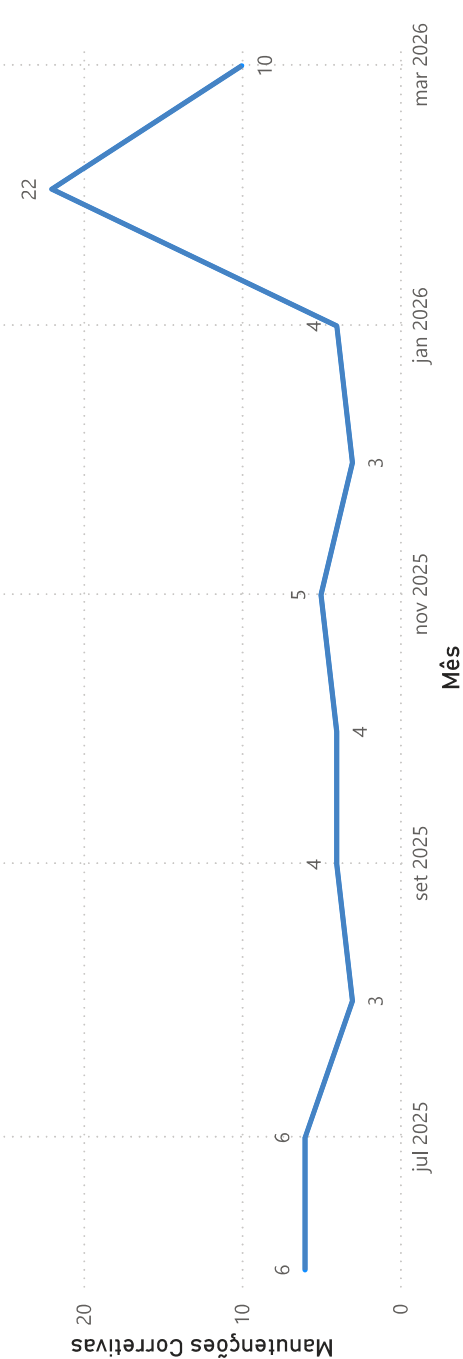

● Câmeras Offline ● Qtde_Câmeras Online

Quantidade de horas gastas por sistema - SDAI / SCA / CFTV



Horas selecionadas
160

Horas por semana
40h

Filtrar mês e ano

Seleções múltiplas

Filtrar Semana


Seleções múltiplas

Quantidade de horas semanais por sistema


● Horas em SDAI ● Horas em SCA ● Horas em CFTV ● 40hs semanais




Quantidade de horas no CFTV por semana



Quantidade de horas no SCA por semana



Quantidade de horas no SDAI por semana



Falhas

361

Detectores em falhas


217

Módulos em falhas


49

2025 2026


Torre A

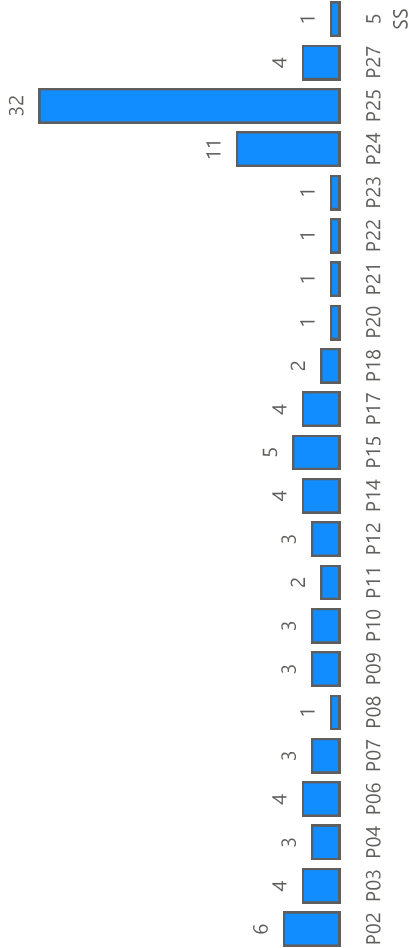

MALL e Centrais



Falhas por local




- ☐ N002
- ☐ N004
- ☐ N005
- ☐ N007
- ☐ N008

Detectores

Módulos

Torre B

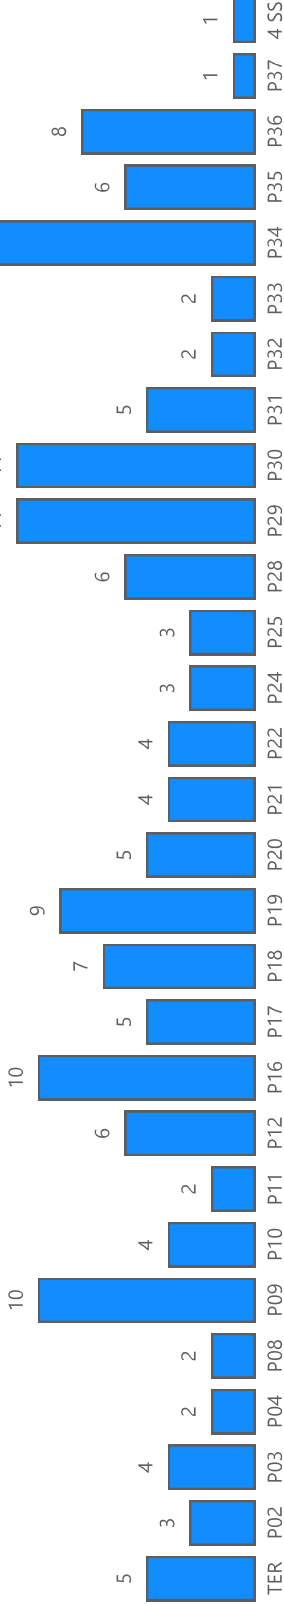

ID_Endereco Custom_Label

N005L04D93	Suzano Corredor
N007L03D3	STAFF
N002L04D136	Salao Beleza
N002L04D137	Salao Beleza
N005L05D35	Sala 74
N005L05D124	Sala 43
N004L10D60	Sala 3701
N004L10D150	Sala 3621
N004L10D82	Sala 3618

SDAI - Desabilitados atuais por local

- ☐ N002
- ☐ N004
- ☐ N005
- ☐ N007

Desabilitados

70


- ☐ Detectores
- ☐ Módulos

dezembro de 2025	janeiro de 2026	fevereiro de 2026	março de 2026
------------------	-----------------	-------------------	---------------

Pavimento

1 SS	3 SS	4-5 SS	P01	P03	P07	P11	P16	P20	P23	P25	P28	P33	P37
2 SS	4 SS	5 SS	P02	P05	P09	P15	P17	P22	P24	P27	P31	P36	TER

Desabilitados por andar e local

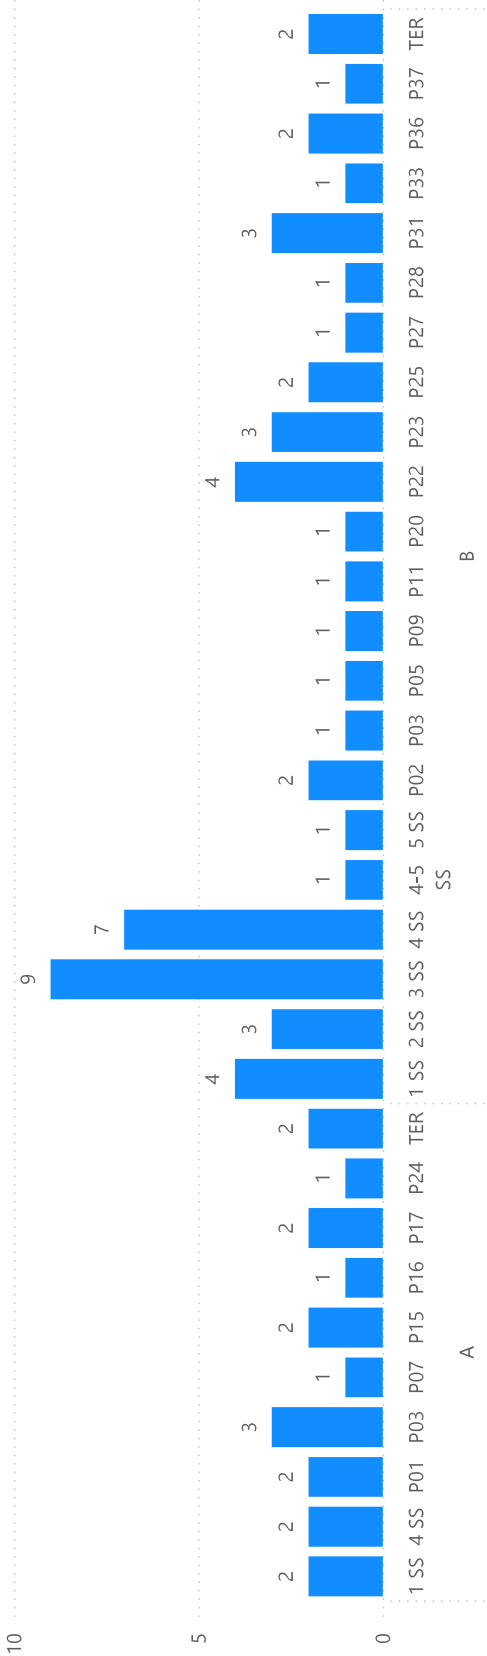


Endereco	Label	Tipo	Andar	Torre
N002L02M22	Acionador 02 JV	Módulos	P03	B
N005L06M7	Acionador Hall Elev	Módulos	P01	A
N005L06M13	Acionador Mod C	Módulos	1 SS	A
N005L06D1	Area Tecnica 2	Detectores	P01	A
N002L03M5	BANHEIRO PNE	Módulos	P05	B
N002L08M11	BANHEIRO PNE	Módulos	P20	B
N002L09M13	BANHEIRO PNE	Módulos	P27	B
N004L01M3	BANHEIRO PNE	Módulos	P09	B
N004L02M21	BANHEIRO PNE	Módulos	P11	B
N004L05M1	BANHEIRO PNE	Módulos	P22	B
N004L10M21	BANHEIRO PNE	Módulos	P36	B
N005L03D146	CAIXA Janela Superin	Detectores	P15	A
N005L03D124	CAIXA Reunião 3	Detectores	P15	A

Desabilitados por torre

CFTV - Mapeamento das câmeras e NVRs




NVR 1




NVR 2




NVR 3




NVR 4



NVR 5




NVR 6




Câmeras Online	376
Câmeras Offline	9


Câmeras Online e Offline por Pavimento - Torre A

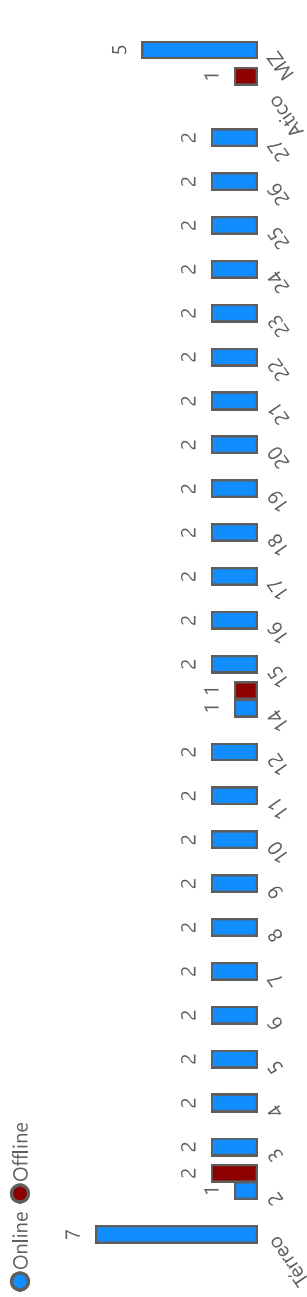

Câmeras Online e Offline por Elevadores - Torre A

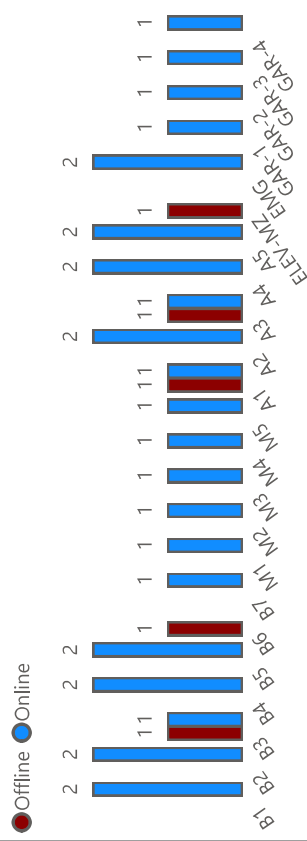

Câmeras Online e Offline por Pavimento - Torre B



Offline

Online

Offline
9

Online
376

Descrição do local das câmeras

Label	Torre	NVR	Status	Pavimento	OBS
[A-2]	A	1	Offline	2	A câmera está desligada / em nenhum canal
[A-B3] ELEVADOR ZONA BAIXA	A	1	Offline	B3	
[ATI] ATICO	A	1	Offline	Atico	Câmera está ligada e não está comunicando com o NVR
[B-A1] ELEVADOR ZONA ALTA	B	1	Offline	A1	Foi verificado pelo Flavio e identificado a antena do elev danificada
[B-A3] ELEVADOR ZONA ALTA	B	1	Offline	A3	
[B-B6] ELEVADOR ZONA BAIXA	B	1	Offline	B6	
[ELEV-MZ] ELEVADOR MEZANINO	A	1	Offline	ELEV-MZ	O Flavio e o Valdemir vai dar continuidade
Corredor Elevador II	A	1	Offline	14	Cabeamento rompido verificado pelo Flavio
Corredor Elevador I	A	1	Offline	2	A câmera está desligada / em nenhum canal

Sugestão de Melhorias

SDAI – Atuação de manutenção para eliminar falhas

- Realizar o acesso nas áreas privativas, contando com a total liberação para resolver e identificar problemas.
- (Estamos atuando nessas atividades)

SDAI - Estudar a melhor forma de expansão do sistema de incêndio

- Atualmente estamos com muitos locais sobrecarregados e com zero espaço no laço para novos equipamentos

Mapeamento do SDAI - DOMO BUSINESS

Quantidade de dispositivos programados no sistema

Módulos

1188

Detectors

4345


Detectors + Módulos

5533


Livre

Ocupado


Dispositivos programados na Torre A

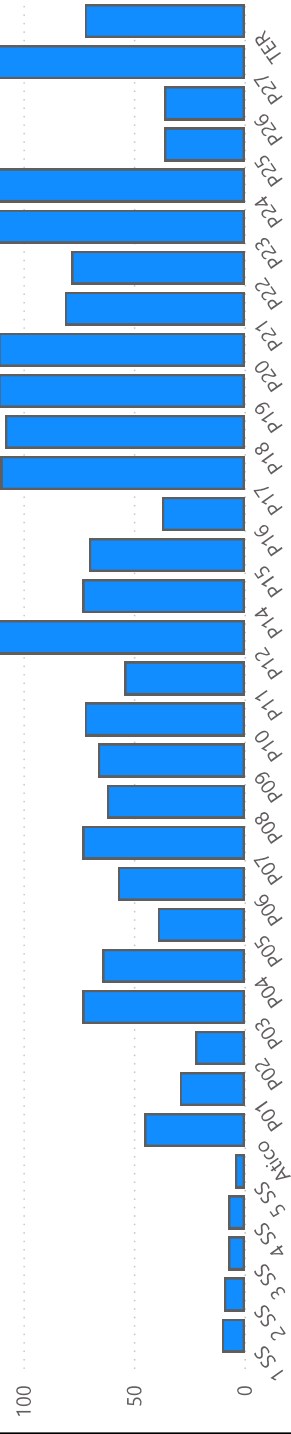


Detectors e Módulos



Dispositivos por local



Dispositivos programados na Torre B

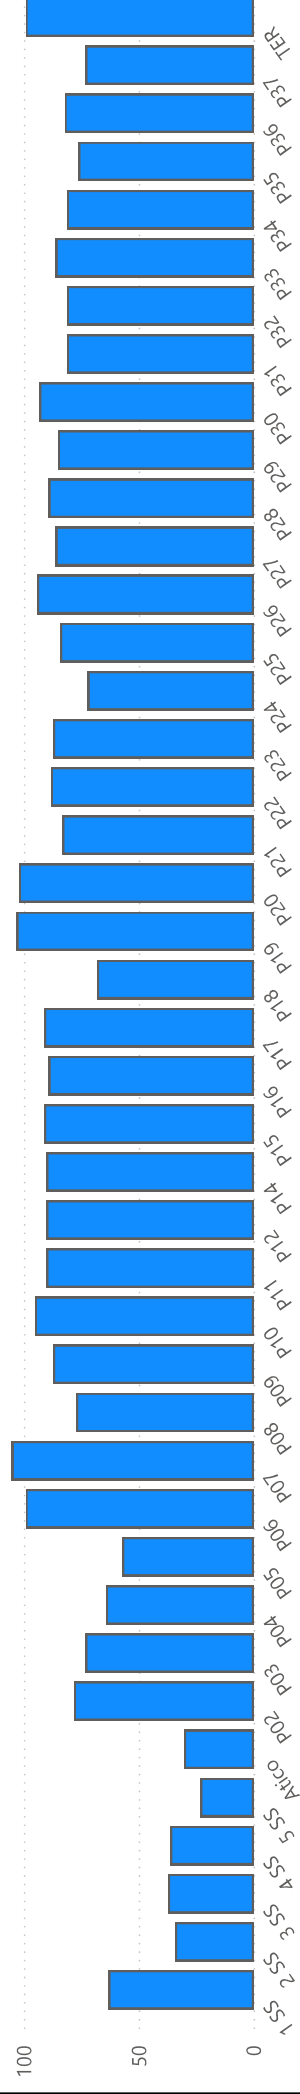

Mapeamento SDAI de laços e andares nas torres

Quantidade de dispositivos programados



Painel

N002


N004

N005


N007

N008

Dispositivos programados por painel e laço da torre A - capacidade máxima: 159

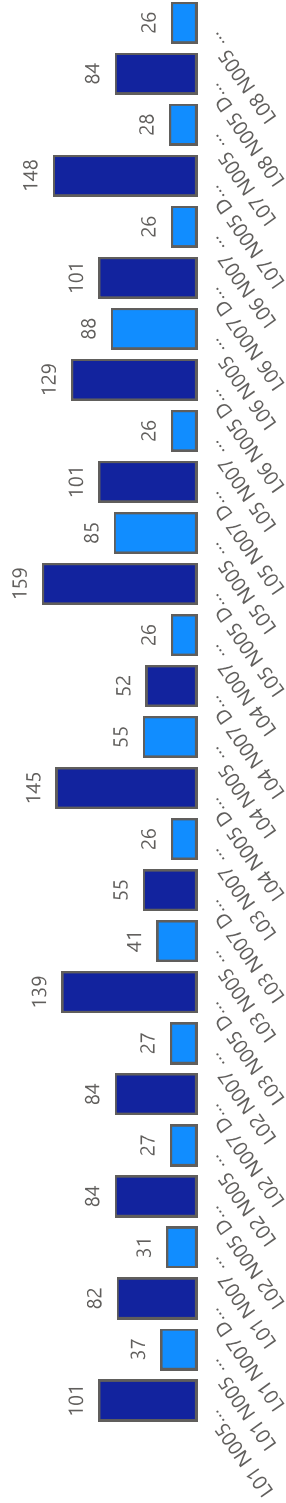


Dispositivos programados por painel e laço da torre B - capacidade máxima: 159

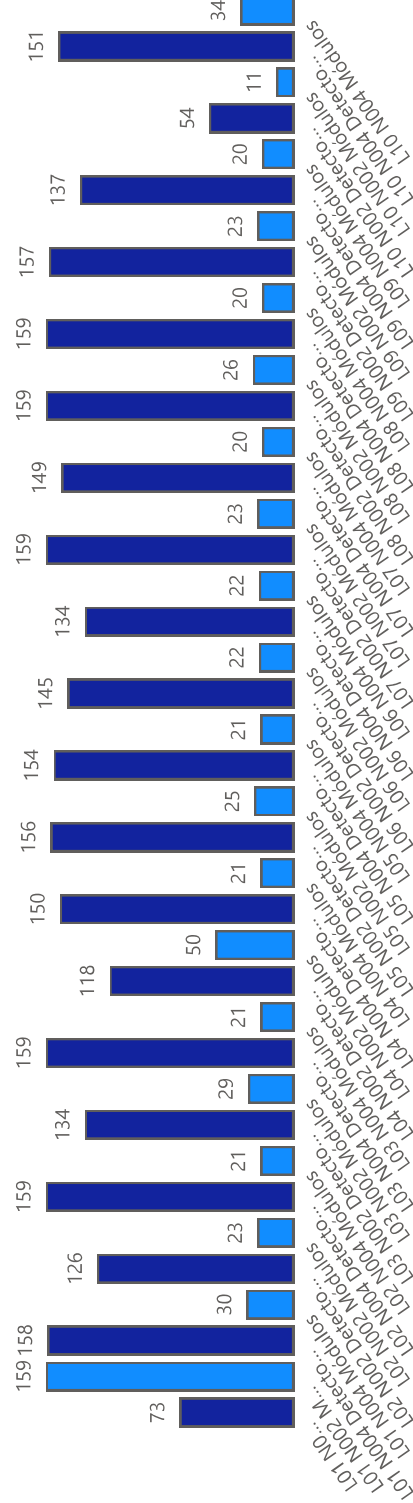

Mapeamento dos laços e andares


Torre	Andar	Laço
B	1 SS	L01
B	2 SS	L01
B	3 SS	L01
B	4 SS	L01
B	4-5 SS	L01
B	5 SS	L01
A	Atico	L01
B	P09	L01
B	P10	L01
A	P18	L01
A	P25	L01
A	P26	L01
A	P27	L01
A	TER	L01
B	TER	L01
B	P02	L02
B	P03	L02
B	P11	L02
B	P12	L02
A	P13	L02

Quantidade de detectores programados por andar e laço da torre B




Os andares que estão em vermelho, estão sem espaço no laço para novos equipamentos

Quantidade de detectores programados por andar

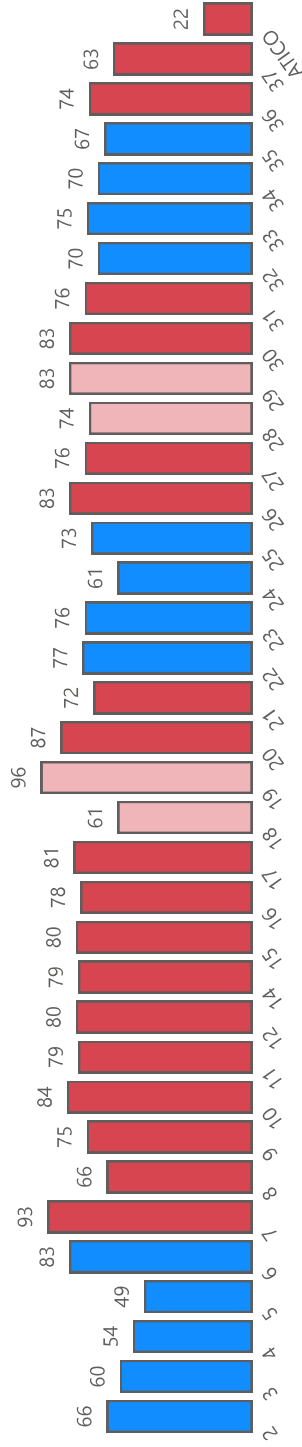


Quantidade de salas ocupadas por andar

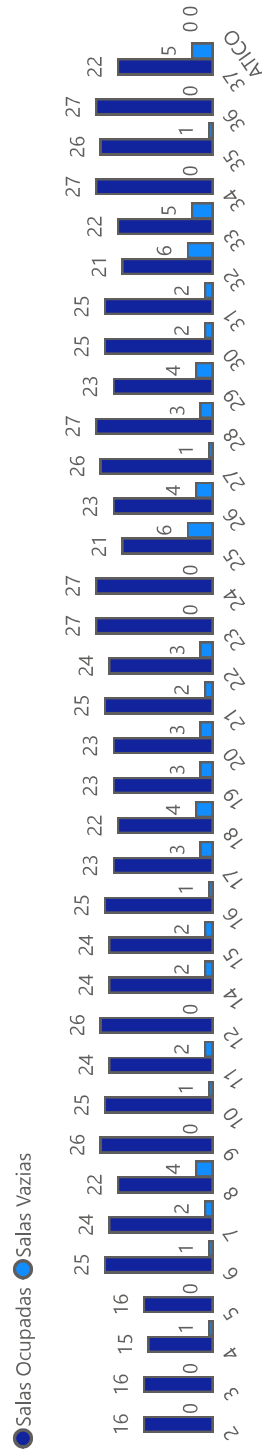


Salas Vazias	Andar	Total Prog	Painel e Laco
0	2	126	N2L2
0	3	126	N2L2
1	4	54	N2L10
0	5	132	N2L3
1	6	132	N2L3
2	7	159	N2L7
4	8	159	N2L7
0	9	159	N4L1
1	10	159	N4L1
2	11	159	N4L2
0	12	159	N4L2
2	14	159	N2L5
2	15	159	N2L5
1	16	159	N4L3
3	17	159	N4L3
4	18	157	N4L4
3	19	157	N4L4
3	20	159	N2L8
2	21	159	N2L8
3	22	153	N4L5
0	23	153	N4L5
0	24	134	N4L6
6	25	134	N4L6
4	26	159	N2L9
1	27	159	N2L9
3	28	157	N4L7
4	29	157	N4L7
2	30	159	N4L8

Quantidade de detectores programados por andar e laço da torre A




Os andares que estão em vermelho, estão sem espaço no laço para novos equipamentos

Quantidade de detectores programados por andar

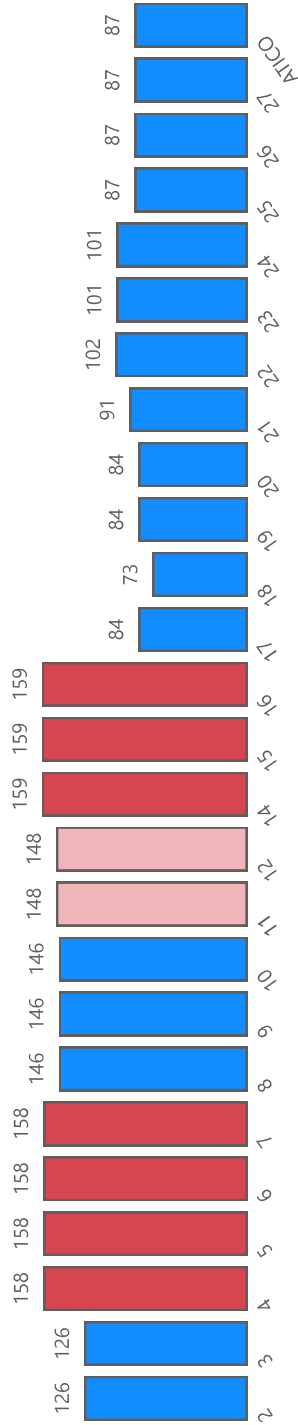

Quantidade de salas ocupadas por andar

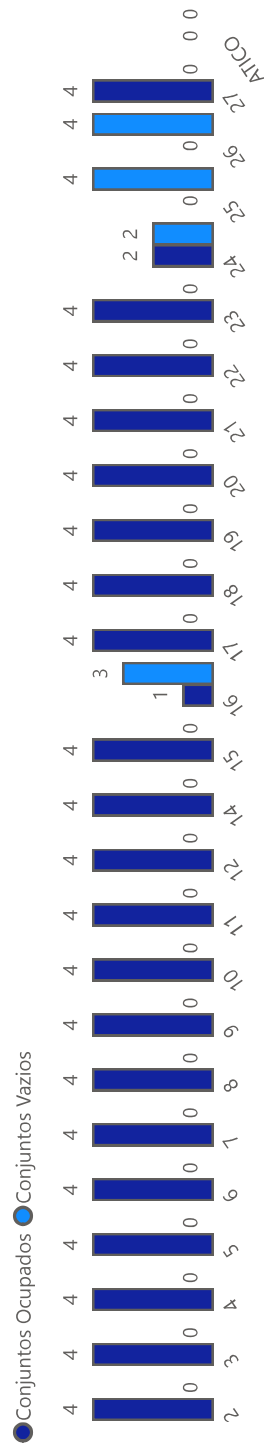

Salas Vazias	Andar	Total Prog	Painel e Laco
0	2	126	N5L6
0	3	126	N5L6
0	4	158	N5L5
0	5	158	N5L5
0	6	158	N5L5
0	7	158	N5L5
0	8	146	N5L4
0	9	146	N5L4
0	10	146	N5L4
0	11	148	N5L7
0	12	148	N5L7
0	14	159	N5L3
0	15	159	N5L3
3	16	159	N5L3
0	17	84	N5L8
0	18	73	N7L1
0	19	84	N5L2
0	20	84	N7L2
0	21	91	N7L3
0	22	102	N7L4
0	23	101	N7L5
2	24	101	N7L6
4	25	87	N5L1
4	26	87	N5L1
0	27	87	N5L1
0	ATICO	87	N5L1

SDAI - Módulos desabilitados e em falha



☒ CONTROL

☒ MANUAL STATION

☒ MINI/DUAL MONITOR

☒ RELAY

☒ ZONE MONITOR

junho de 2025

dezembro de 2025

janeiro de 2026

fevereiro de 2026

março de 2026

- ☒ CONTROL
- ☒ MANUAL STATION
- ☒ MINI/DUAL MONIT...
- ☒ MONITOR
- ☒ RELAY
- ☒ ZONE MONITOR

Módulos danificados ou em falha

49

Módulos programados

1167

ID_Endereco	Type_Code_Label	FlashScan_Type	Custom_Label	Local_Torre	ID_Endereco	Type_Code_Label	FlashScan_Type	Custom_Label	Local_Torre
N002L02M23	Pull Station	MANUAL STATION	Acionador 01 PB	B	N002L01M100	Relay	RELAY	Desliga Insuflamento	B
N002L02M30	Pull Station	MANUAL STATION	Acionador 02 JV	B	N002L01M101	Relay	RELAY	Pressurizacao	B
N002L04M121	Heat Detect	ZONE MONITOR	Detectores Mod G	B	N002L01M102	Relay	RELAY	Pressurizacao	B
N002L04M128	Pull Station	MANUAL STATION	Acionador Mod F	B	N002L01M103	Relay	RELAY	Desliga Insuflamento	B
N002L04M130	Pull Station	MANUAL STATION	Acionador Mod D	B	N002L01M104	Pull Station	MANUAL STATION	Acionador Cs Maq	B
N002L04M132	Heat Detect	ZONE MONITOR	Detectores Mod D	B	N002L01M105	Relay	RELAY	Pressurizacao	B
N002L04M137	Heat Detect	ZONE MONITOR	Detectores Mod E	B	N002L01M106	Horn Circuit	CONTROL	Sirene	B
N002L04M4	Pull Station	MANUAL STATION	Mall Externo	MALL	N002L01M107	Telephone	CONTROL	Hot Line	B
N002L07M5	Pull Station	MANUAL STATION	Acionador 02 PB	B	N002L01M110	Heat Detect	ZONE MONITOR	Detectores Mod G	B
N004L01M14	Telephone	CONTROL	Hot Line	B	N002L01M111	Heat Detect	ZONE MONITOR	Detectores Mod D	B
N004L01M18	Pull Station	MANUAL STATION	Acionador 02 JV	B	N002L01M112	Heat Detect	ZONE MONITOR	Detectores Mod D	B
N004L01M19	Pull Station	MANUAL STATION	Acionador 01 PB	B	N002L01M113	Heat Detect	ZONE MONITOR	Detectores Mod F	B
N004L02M11	Relay	RELAY	Damper	B	N002L01M114	Heat Detect	ZONE MONITOR	Detectores Mod F	B
N004L02M18	Pull Station	MANUAL STATION	Acionador 02 JV	B	N002L01M115	Heat Detect	ZONE MONITOR	Detectores Mod G	B
N004L03M20	Pull Station	MANUAL STATION	Acionador Hall Elev	B	N002L01M116	Heat Detect	ZONE MONITOR	Detectores Mod G	B
N004L04M4	Telephone	CONTROL	Hot Line	B	N002L01M117	Heat Detect	ZONE MONITOR	Detectores Mod E	B
N004L05M11	Relay	RELAY	Damper	B	N002L01M118	Heat Detect	ZONE MONITOR	Detectores Mod E	B
N004L07M20	Pull Station	MANUAL STATION	Acionador Hall Elev	B	N002L01M155	Heat Detect	ZONE MONITOR	Detectores Mod E	B

Próximos Desafios

Teste Geral do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio

- Testes programados e em execução do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio, para garantia do funcionamento da lógica programada, funcionamento de sirenes e comandos do sistema.

Corretivas - SDAI

- Continuidade na correção das falhas do Sistema de Detecção e Alarme de incêndio, viabilizando 100% de disponibilidade

Corretivas - CFTV

- Garantir o retrofit finalizado das câmeras, ainda possui locais sem vídeo e está em processo de finalização

Organograma da Equipe

Estrutura

